

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 05
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO	

ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 05		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 06	
No. Lote	TAREA	No. Lote	TAREA
L04	Se inició con el pegado de ladrillo y block en muros	L02	Colocación de cimbra perimetral
L04	Se inició con el colado de castillos	L02	Fumigacion
L04	Se colaron zapatas aisladas	L02	Colocación de Hule negro
L02	Se colocó tubería de gas	L02	Colocación de Acero de cimentación y castillos
L02	Se colocó tubería de instalaciones Hidrosanitarias	L02	Colado de losa de cimentación
L02	Se continuó con habilitado de acero para cimentación	L03	Terminación de instalaciones Hidrosanitarias
L03	Se suministró material de instalaciones hidrosanitarias	L03	Fumigacion
L20	Se realizó el trazo del terreno	L03	Colocación de Hule negro
L21	Se realizó el trazo del terreno	L03	Colocación de Acero de cimentación y castillos
L21	Se iniciaron excavaciones	L20	Realizar excavaciones
L22	Se realizó el trazo del terreno	L21	Inicio de instalaciones hidrosanitarias
L22	Se iniciaron excavaciones	L21	Inicio de habilitado de acero para cimentación
		L22	Inicio de instalaciones hidrosanitarias
		L22	Inicio de habilitado de acero para cimentación

PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS	ESTATUS	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
- Se observó que los catálogos de mods. Artico no consideran la partida de: Aplanados exteriores en muros	En revisión	--	Metta / Altozano
- La estimación 01 ingreso con 1 semana de retraso, por falta de registro en Altozano. Los puntos de trazo de lotes 20, 21 y 22 se entregaron esta semana. <u>Esto genera días 7 hábiles de movimiento en programa de obra.</u>	Identificado en Bitácora Reprogramado	--	Metta / Altozano
Se freno o se pospuso pago de estimación 04 por errores administrativos	Identificado en Bitácora		Altozano


CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	8.62%	9.35%	0.72%	8.62% 9.35%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	5.08%	5.18%	0.10%	5.08% 5.18%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	4.57%	4.32%	-0.25%	4.57% 4.32%
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	0.68%	0.12%	-0.56%	0.68% 0.12%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	0.45%	0.47%	0.02%	0.45% 0.47%
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	0.39%	0.51%	0.12%	0.39% 0.51%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
ALTOZANO - METTA - 6 CASAS	200 días	lun 11/5/26	jue 21/1/27							
HITOS IMPORTANTES	25 días	lun 11/5/26	mié 10/6/26							
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	180 días	lun 11/5/26	mar 22/12/26							
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	183 días	mié 20/5/26	lun 11/1/27							
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	186 días	mié 20/5/26	jue 14/1/27							
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	184 días	vie 29/5/26	jue 21/1/27							
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	184 días	vie 29/5/26	jue 21/1/27							
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	174 días	mié 10/6/26	mié 20/1/27							

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

metta arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 05
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO	

PROGRAMA MAESTRO

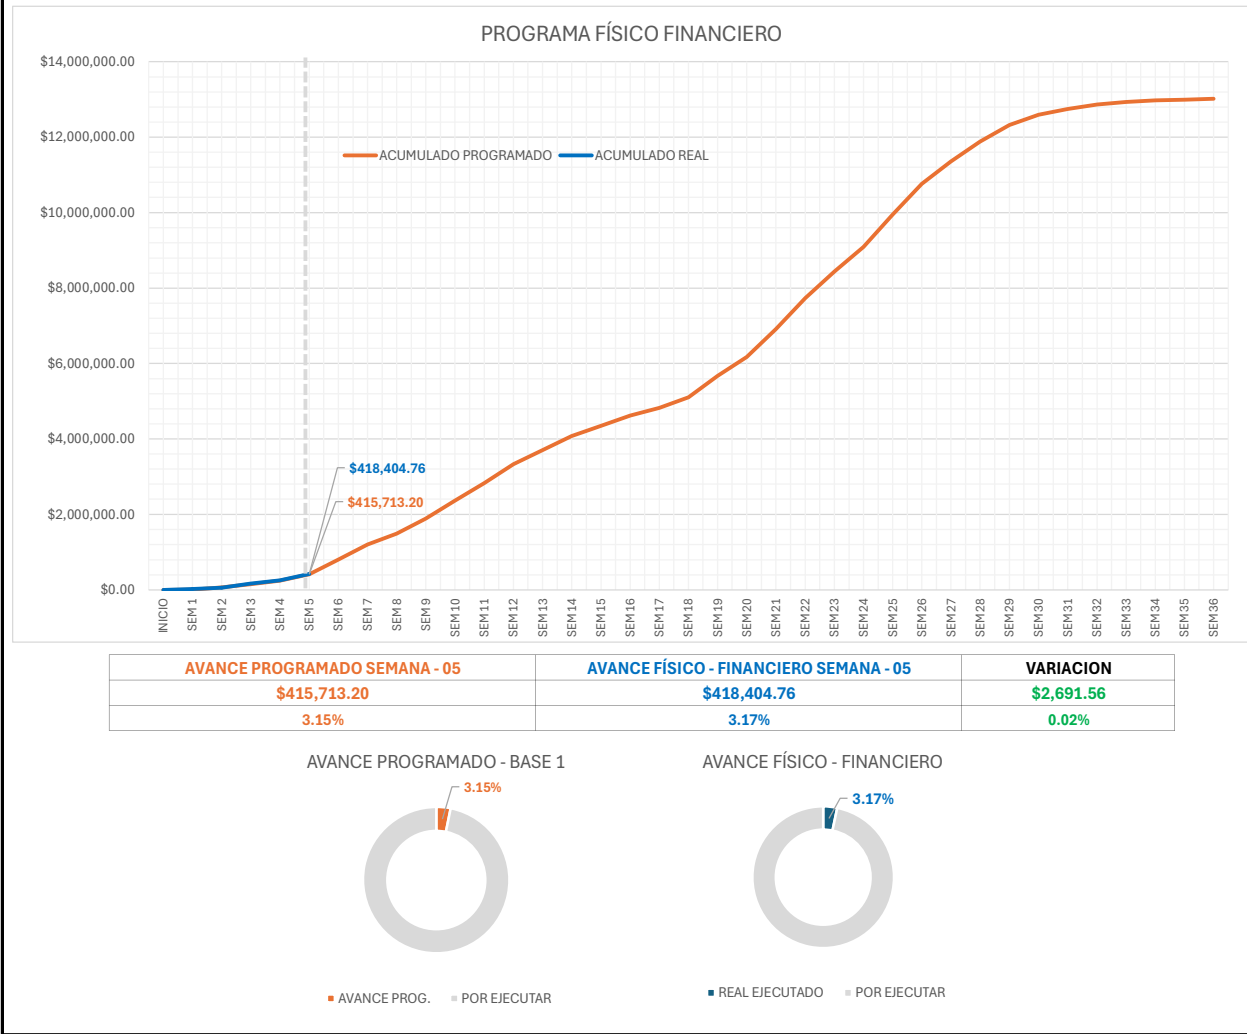

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 05			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Resto de acero Lote 02 Mza 661 (Castillos y malla electrosoldada)	8-jun	Suministrado	Alta
Tabique y block muros Lote 04 Mza 661	8-jun	Suministrado	Alta
Acero para cimentación Lote 03 Mza 661	10-jun	Suministrado	Alta
Material hidrosanitario Lote 03 Mza 661	8-jun	Suministrado	Media
Material Gas Lote 02 y 03 Mza 661	46181	Suministrado	Alta
Hule Negro para Lote 02 y 03 Mza 661	46181	Suministrado	Alta
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Concreto para colado de cimentación L02	17-jun	Solicitado	Alta
Ladrillo y Block para L02	17-jun	Solicitado	Media
Complemento de reglas para cimbra L03	15-jun	Solicitado	Media
Agregados: Arena, grava y sello, para castillos L04	15-jun	Solicitado	Alta
Madera para cimbra de colado de columnas L04	15-jun	Solicitado	Media
Cierre de Ladrillo para L04	15-jun	Solicitado	Alta
Armex para cadenas L04	15-jun	Solicitado	Alta
Cemento Cal, para L04 y L02	15-jun	Solicitado	Alta

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO

SEMANA No.

05

REPORTE FOTOGRÁFICO




LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	8.62%
AVANCE REAL:	9.35%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Pegado de muros de ladrillo y block
Colado de castillos
Colado de zapatas aisladas

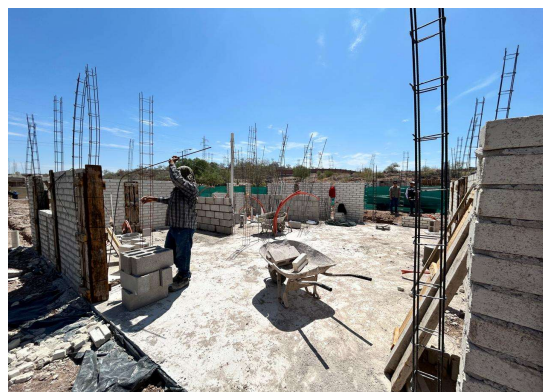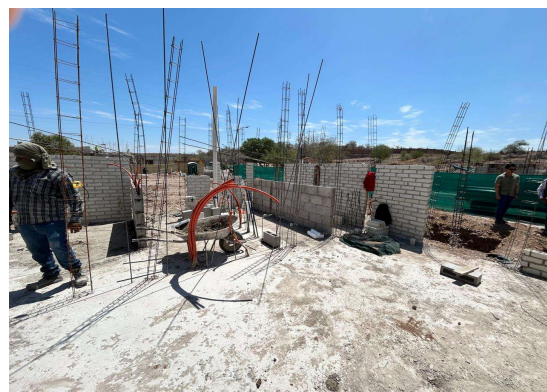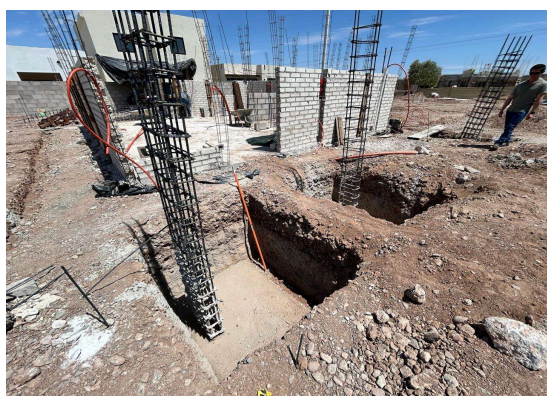

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO

SEMANA No.

05

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - MZA 661




AVANCE PROGRAMADO:	5.08%
AVANCE REAL:	5.18%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Termino de instalaciones Hidro-Sanitarias

Termino de instalaciones de Gas

Término de Habilitado de acero

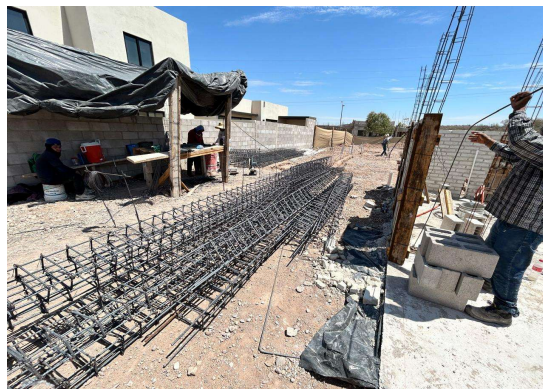

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO

SEMANA No.

05

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	4.57%
AVANCE REAL:	4.32%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

Excavaciones de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO

SEMANA No.

05

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.68%
AVANCE REAL:	0.12%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

** - Los puntos de arranque tenían detalles ya solucionados



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO

SEMANA No.

05

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 21 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.45%
AVANCE REAL:	0.47%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 05 - DEL 08 AL 13 DE JUNIO

SEMANA No.

05

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.39%
AVANCE REAL:	0.51%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación

