

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 04
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 04 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO	

ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 04	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 05
- Colado de Losa de Cimentación de Lote 04 M661	- Colado de Zapatas Aisladas Lote 04 M661
- Excavación y afine de zanjas de zapatas aisladas Lote 04 M661	- Inicio de pegado de Ladrillo en Muros Lote 04 M661
- Colado de Plantilla en Lote 04 M661	- Continuar trazo y nivelación pendiente en Lotes 20 y 22 MZA 663
- Colocación de acero en Zapatas aisladas y columnas Lote 04 M661	- Colocación de instalaciones de gas en Lote 02 M661
- Terminó de excavaciones en Lotes 02 y 03 M661	- Colocación de instalaciones Hidrosanitarias en Lote 02 M661
- Habilitado de acero para cimentación Lote 02 M661	- Colocación de cimbra perimetral en Lote 02 M661
- Habilitado de Cimbra perimetral para cimentación Lote 02 M661	- Fumigación en Lote 02 M661
- Habilitado de instalaciones sanitarias Lote 02 M661	- Colocación de Hule Negro en Lote 02 M661
- Trazo en Lote 20 M663	- Colocación de acero de refuerzo para cimentación Lote 02 M661
- Cobro de estimación 01 (Retrazada) y estimación 02 (Normal)	- Colado de cimentación en Lote 02 M661
- Ingreso de estimación 03	- Colocación de instalaciones de gas en Lote 03 M661
- Colocación de Tapiales Perimetrales de malla sombra verde en frentes de lotes	- Colocación de instalaciones Hidrosanitarias en Lote 03 M661
	- Colocación de cimbra perimetral en Lote 03 M661
	- Fumigación y colocación de Hule Negro en Lote 03 M661
	- Colocación de acero de refuerzo para cimentación Lote 03 M661

PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS	ESTATUS	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
- Se observó que los catálogos de modelos Artico no consideran la partida de: Aplanados exteriores en muros	En revisión	--	Metta / Altozano
- No se estimó la estimación 01 en tiempo por falta de alta en sistema	Solventado	5-jun	Altozano
- No tenemos Orden de Trabajo para cobrar tapiales perimetrales	Notificado	6-jun	Altozano


CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	5.57%	8.02%	2.45%	
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	3.96%	2.07%	-1.89%	
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	3.96%	2.07%	-1.89%	
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	0.32%	0.12%	-0.20%	
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	0.45%	0.37%	-0.08%	
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	0.00%	0.37%	0.37%	

1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S1	S2	S3	S4
1	ALTOZANO - METTA - 6 CASAS	199 días	lun 11/5/26	mié 20/1/27				
2	HITOS IMPORTANTES	14 días	lun 11/5/26	mié 27/5/26				
10	LOTE 04 M-661 ARTICO-A	175 días	lun 11/5/26	mié 16/12/26				
269	LOTE 02 M-661 CORSAC-B	178 días	mié 20/5/26	lun 4/1/27				
574	LOTE 03 M-661 CORSAC-A	178 días	mié 20/5/26	lun 4/1/27				
879	LOTE 20 M-663 ARTICO-A	181 días	vie 29/5/26	lun 18/1/27				
1184	LOTE 21 M-663 CORSAC-A	181 días	vie 29/5/26	lun 18/1/27				
1489	LOTE 22 M-663 CORSAC-B	174 días	mié 10/6/26	mié 20/1/27				

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 04
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 04 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO	

PROGRAMA MAESTRO

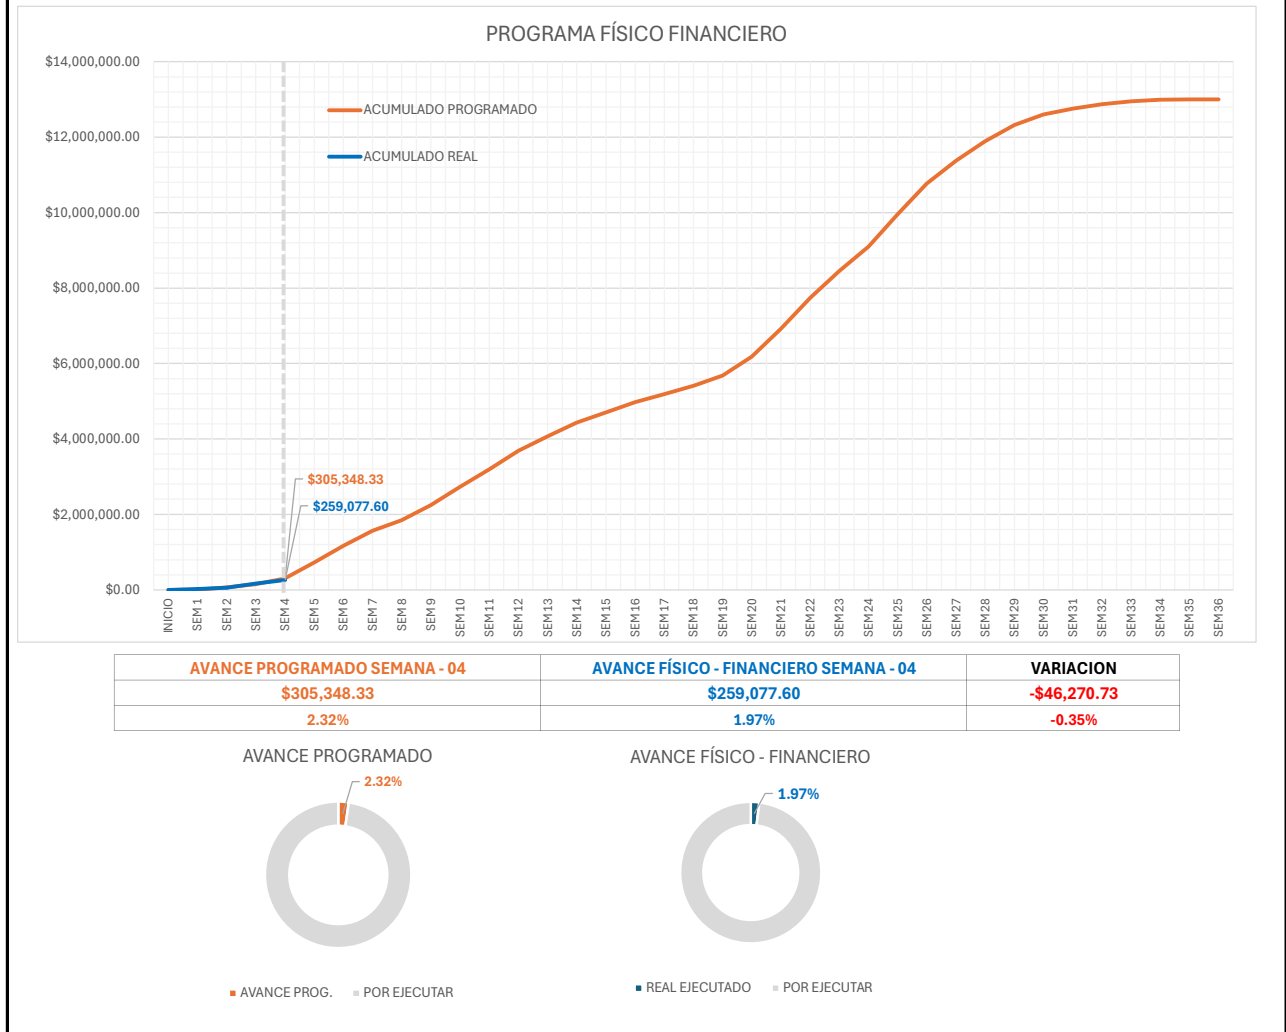

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 04			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Acero para cimentación Lote 02 Mza 661	1-jun	Suministrado	Alta
Material hidrosanitario Lote 02 Mza 661	1-jun	Suministrado	Medio
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Resto de acero Lote 02 Mza 661 (Castillos y malla electrosoldada)	8-jun	Solicitado	Alta
Tabique y block muros Lote 04 Mza 661	8-jun	Solicitado	Alta
Acero para cimentación Lote 03 Mza 661	10-jun	Solicitado	Alta
Material hidrosanitario Lote 03 Mza 661	8-jun	Solicitado	Medio
Material Gas Lote 02 y 03 Mza 661	8-jun	Solicitado	Alta
Hule Negro para Lote 02 y 03 Mza 661	8-jun	Solicitado	Alta
Acero para cimentación Lote 22 Mza 663	10-jun	Solicitado	Medio
Material Hidrosanitario Lote 22 Mza 663	10-jun	Solicitado	Medio

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 04 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO

SEMANA No.

04

REPORTE FOTOGRÁFICO


LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	5.57%
AVANCE REAL:	8.02%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Colado de losa de cimentación
 Excavación y compactación de zanjas para zapatas aisladas
 Platilla en zapatas aisladas
 Colocación de acero en Zapatas Aisladas

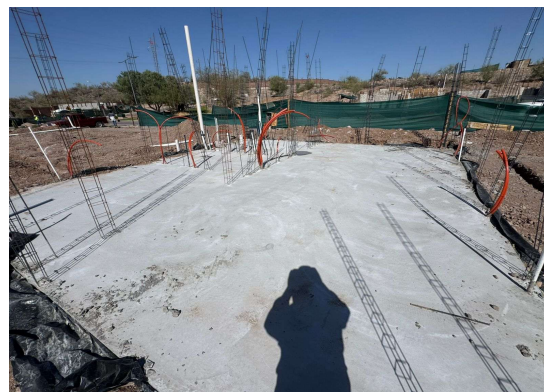

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 04 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO

SEMANA No.

04

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	3.96%
AVANCE REAL:	2.07%

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Termino de excavaciones para cimentación
- Habilitado de cimbra perimetral
- Inicio de instalaciones sanitarias
- Habilitado de acero



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 04 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO

SEMANA No.

04

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	3.96%
AVANCE REAL:	2.07%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

Excavaciones de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 04 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO

SEMANA No.

04

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.32%
AVANCE REAL:	0.12%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

** - Los puntos de arranque tenían detalles ya solucionados



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 04 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO

SEMANA No.

04

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTES 21 y 22, MZA 663

