


REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 06
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 06 - DEL 15 AL 20 DE JUNIO	

PROGRAMA MAESTRO

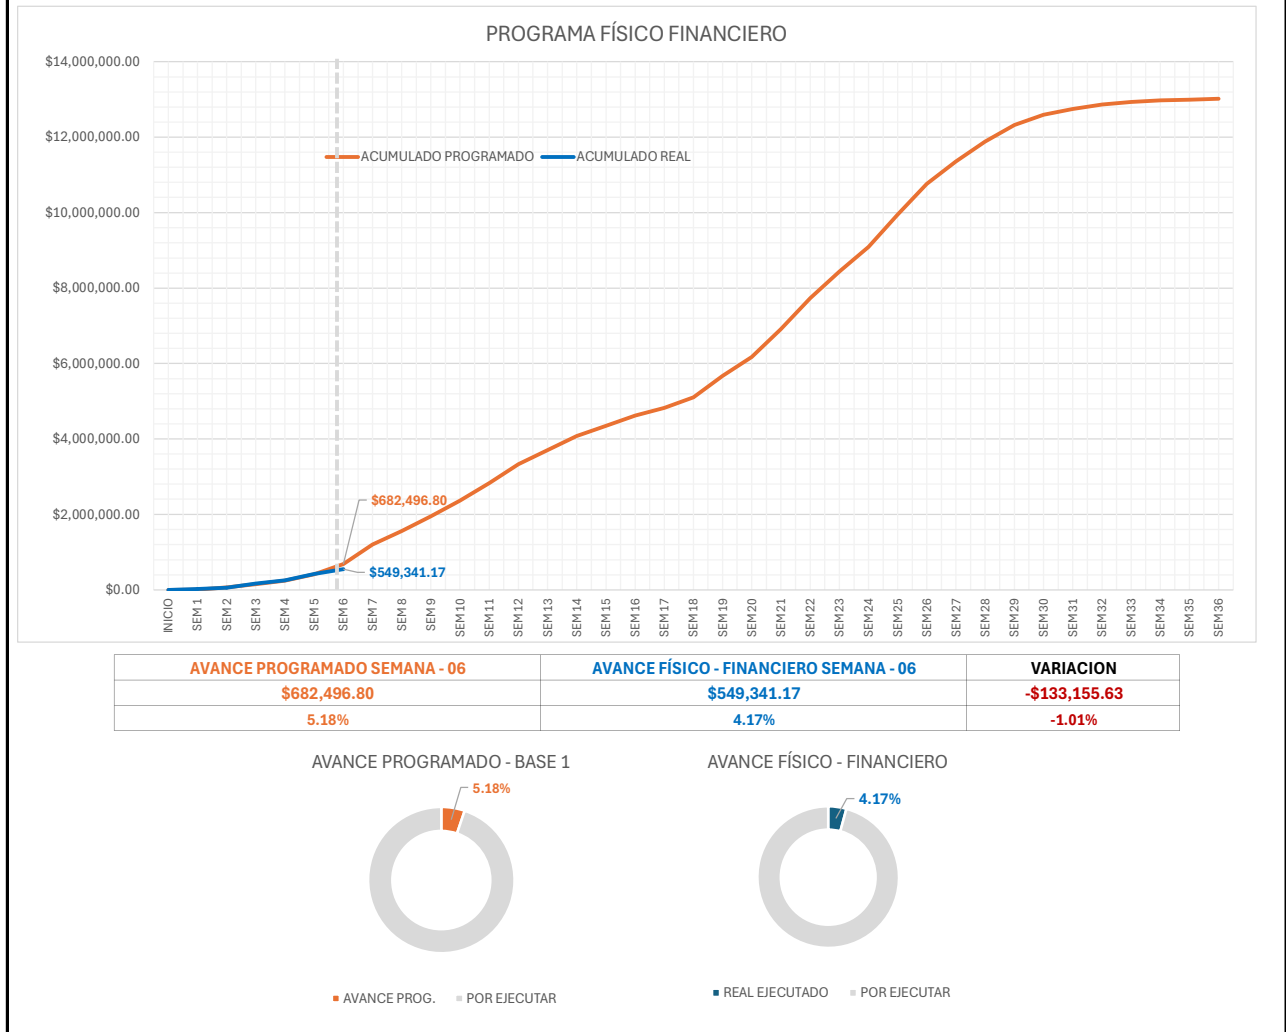

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 06

CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Agregados: Arena, grava y sello, para castillos L04	15-jun	Suministrado	Alta
Madera para cimbra de colado de columnas L04	15-jun	Suministrado	Media
Armex para cadenas L04	15-jun	Suministrado	Alta
Cemento Cal, para L04 y L02	15-jun	Suministrado	Alta

PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS

CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Concreto para colado de cimentación L02	22-jun	Solicitado	Alta
Ladrillo y Block para L02	22-jun	Solicitado	Media
Acero para lote 22	22-jun	Solicitado	Alta
Acero para lote 21	24-jun	Solicitado	Media
Acero para lote 20	24-jun	Solicitado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21	22-jun	Solicitado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 20	24-jun	Solicitado	Media

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 06 - DEL 15 AL 20 DE JUNIO

SEMANA No.

06

REPORTE FOTOGRÁFICO


LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	13.20%
AVANCE REAL:	12.79%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Pegado de muros de ladrillo y block
Colado de castillos
Colado de zapatas aisladas

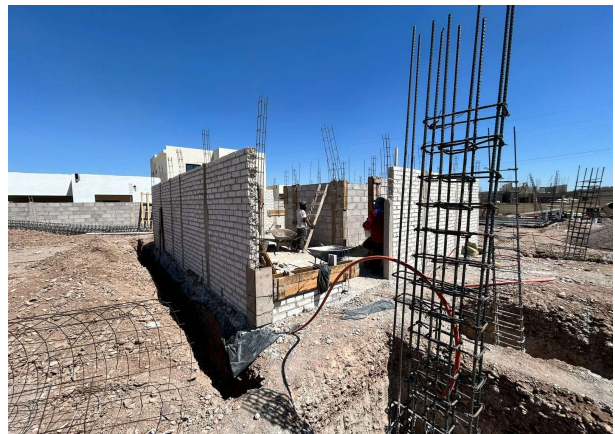

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 06 - DEL 15 AL 20 DE JUNIO

SEMANA No.

06

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - MZA 661






AVANCE PROGRAMADO:	7.99%
AVANCE REAL:	6.32%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Termino de instalaciones Hidro-Sanitarias

Termino de instalaciones de Gas

Término de Habilitado de acero

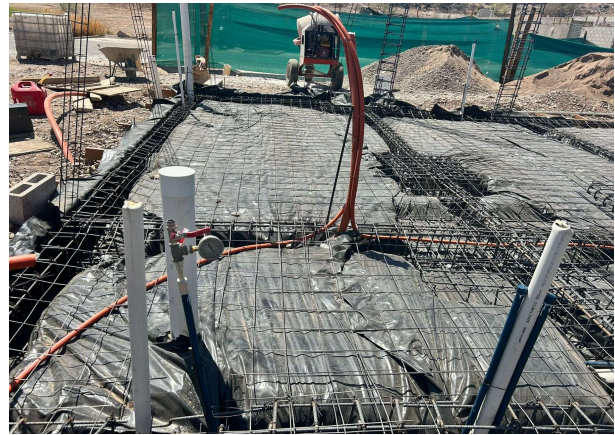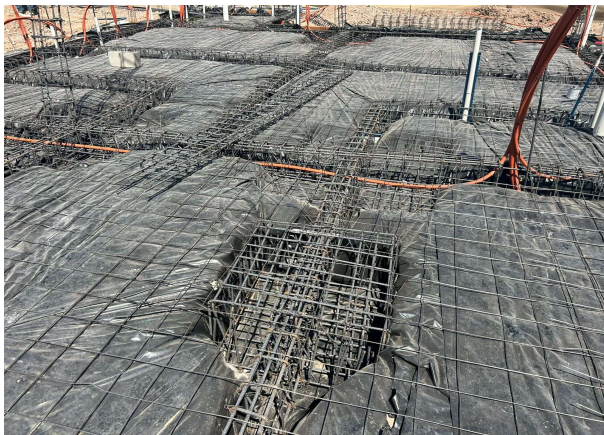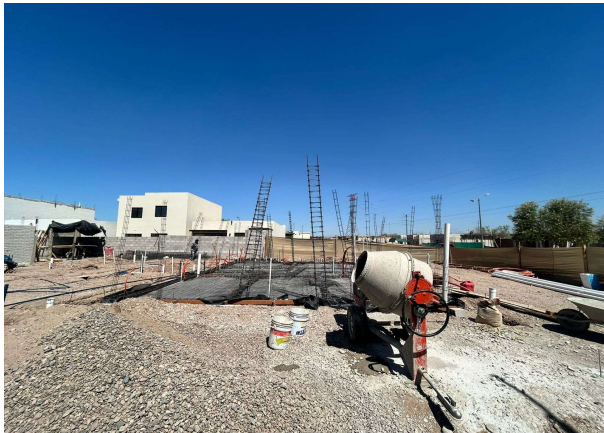

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 06 - DEL 15 AL 20 DE JUNIO

SEMANA No.

06

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661




AVANCE PROGRAMADO:	5.81%
AVANCE REAL:	4.85%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

Excavaciones de cimentación

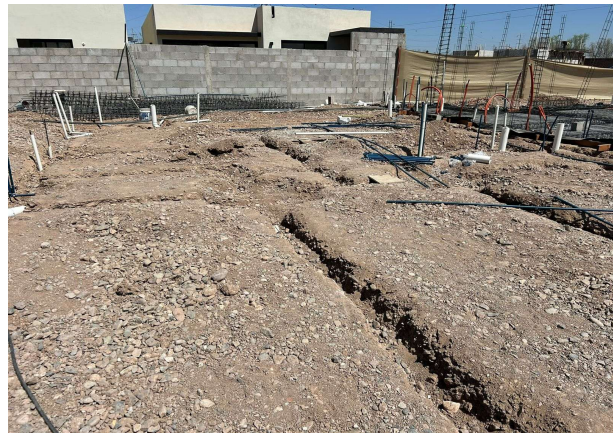

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 06 - DEL 15 AL 20 DE JUNIO

SEMANA No.

06

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	3.91%
AVANCE REAL:	1.33%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

** - Los puntos de arranque tenían detalles ya solucionados



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 06 - DEL 15 AL 20 DE JUNIO

SEMANA No.

06

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 21 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	1.42%
AVANCE REAL:	0.70%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 06 - DEL 15 AL 20 DE JUNIO

SEMANA No.

06

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.70%
AVANCE REAL:	0.71%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación

