

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL


	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 07
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2026	

ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 07		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 08	
No. Lote	TAREA	No. Lote	TAREA
L04	Muros de ladrillo y block hasta altura de cerramiento	L02	Continuar con muros de tabique y block
L02	Colado de cadenas de cerramiento	L02	Iniciar colados de castillos
L02	Colado de losa de cimentación	L03	Terminación de instalaciones Hidrosanitarias
L02	Inicio de Pegado de tabique térmico en muros	L03	Fumigacion
L03	Instalaciones Hidrosanitarias	L03	Colocación de Hule negro
L03	Terminación de habilitado de acero	L03	Colocación de Acero de cimentación y castillos
L22	Inicio de habilitado de acero	L03	Colado de losa de cimentación
L22	Inicio de instalaciones hidrosanitarias y gas	L21	Inicio de instalaciones hidrosanitarias
L21	Terminación de excavaciones	L21	Inicio de habilitado de acero para cimentación
L20	Continuación de excavaciones	L22	Inicio de instalaciones hidrosanitarias
		L22	Inicio de habilitado de acero para cimentación
		L22	Colocación de cimbra perimetral

PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS	ESTATUS	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
Se regularizaron los Pagos. Es importante mantener regular el flujo de pago de las estimaciones	En proceso	--	Altozano
El retraso de los pagos de semanas anteriores afectó el ritmo del proyecto impactando en tiempo	Importante	--	Altozano

CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	15.45%	14.65%	-0.80%	15.45% 14.65%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	10.67%	8.49%	-2.17%	10.67% 8.49%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	5.41%	5.38%	-0.02%	5.41% 5.38%
LOTE 22 M-663 ARTICO-A	2.03%	2.82%	0.79%	2.03% 2.82%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	1.17%	2.81%	1.64%	1.17% 2.81%
LOTE 20 M-663 CORSAC-B	0.76%	0.71%	-0.05%	0.76% 0.71%


LÍNEA DEL TIEMPO GENERAL

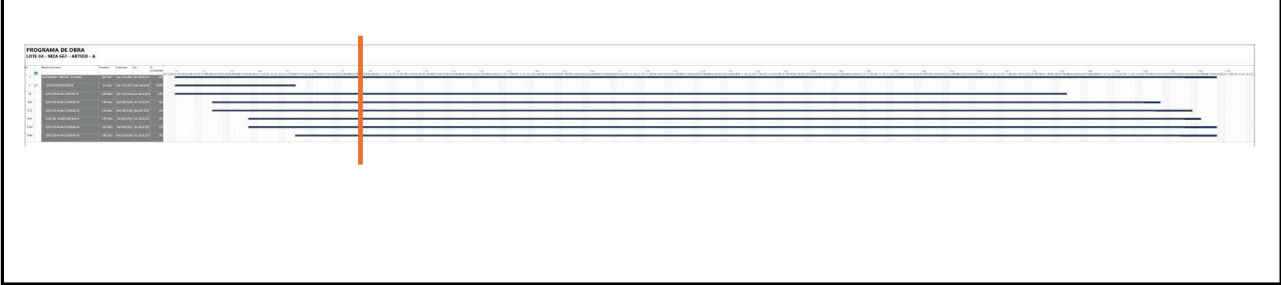

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 07
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2026	

PROGRAMA MAESTRO

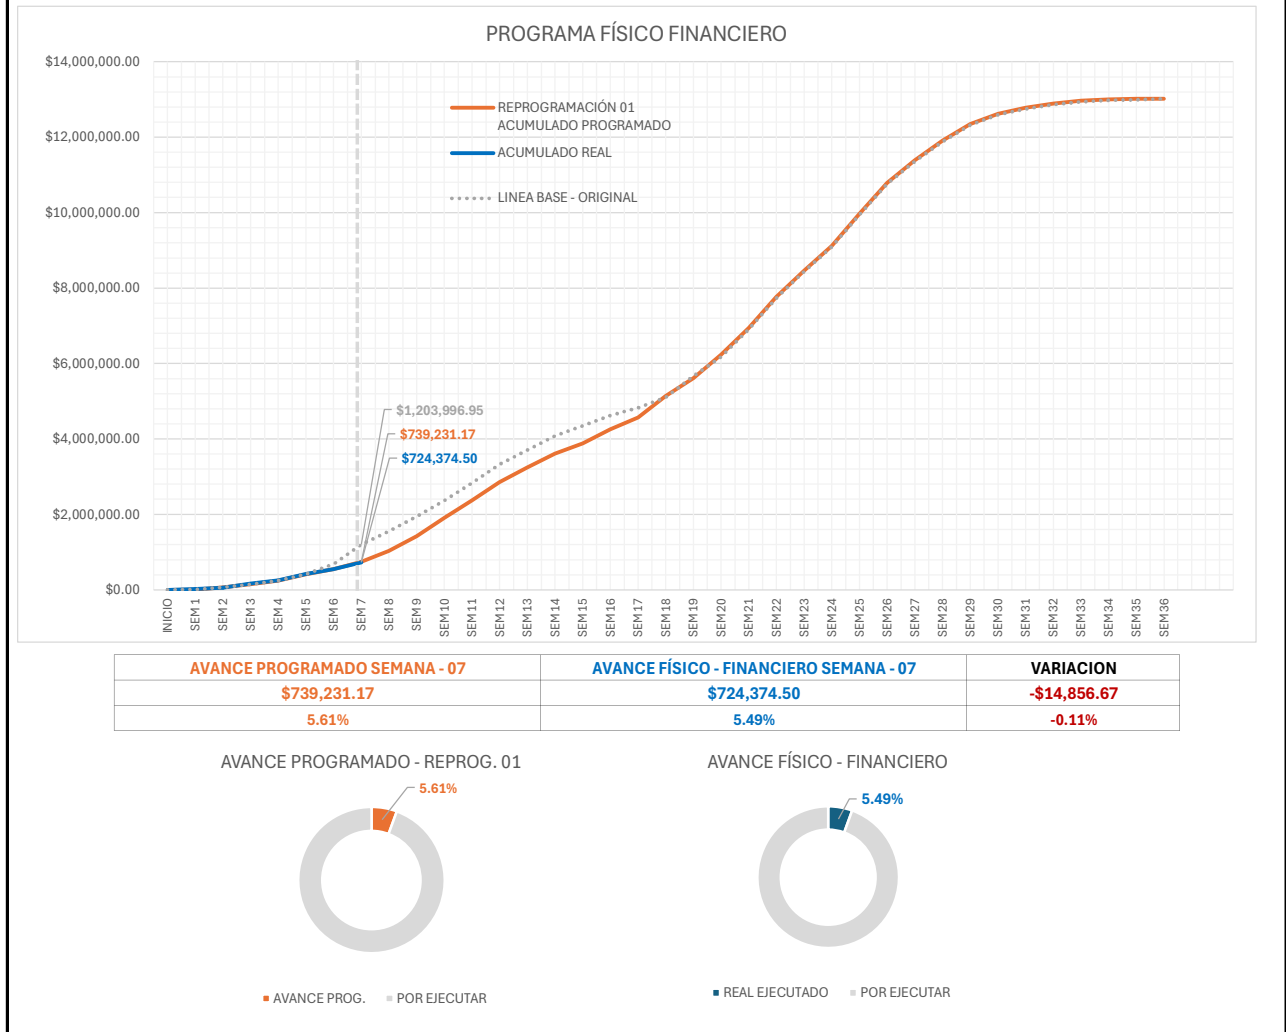

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 06			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Concreto para colado de cimentación L02	22-jun	Suministrado	Alta
Acero para lote 22	27-jun	Suministrado	Alta
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21	27-jun	Suministrado	Media
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Complemento de Ladrillo y Block para L02	29-jun	Solicitado	Media
Acero para lote 21	29-jun	Solicitado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21	29-jun	Solicitado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 20	29-jun	Solicitado	Media
Viguetas para losa de entrepiso Lote 04	--	En cotización	Media

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 07
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO	

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO: 15.45%
AVANCE REAL: 14.65%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Pegado de muros de ladrillo y block
 Colado de castillos
 Colado de zapatas aisladas



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO: ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN: HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO: METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO: SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO

SEMANA No.

07

REPORTE FOTOGRÁFICO


LOTE 02 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO: 10.67%
AVANCE REAL: 8.49%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Terminó de instalaciones Hidro-Sanitarias
 Terminó de instalaciones de Gas
 Término de Habilitado de acero

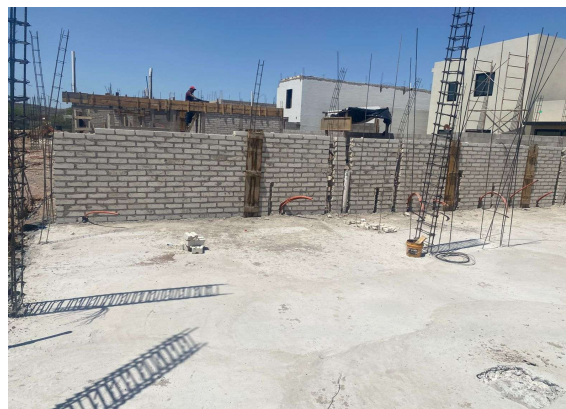

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO

SEMANA No.

07

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	5.41%
AVANCE REAL:	5.38%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo
Excavaciones de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO

SEMANA No.

07

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	2.03%
AVANCE REAL:	2.82%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

** - Los puntos de arranque tenían detalles ya solucionados



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO

SEMANA No.

07

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 21 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	1.17%
AVANCE REAL:	2.81%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO

SEMANA No.

07

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.76%
AVANCE REAL:	0.71%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación

