

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL


	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 08
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026	

ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 08		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 09	
No. Lote	TAREA	No. Lote	TAREA
L02	Se continuó con muros de tabique	L02	Continuar con muros de tabique y block
L03	Se terminaron Instalaciones Hidro-Sanitarias	L02	Iniciar colados de castillos
L03	Se realizó fumigación	L03	Colado de losa de cimentación
L03	Se colocó hule negro	L04	Suministro de vigetas pretensadas para losa entrepiso
L03	Se colocó acero de trabes de cimentación en sitio	L04	Suministro de cimbra para losa y escalera
L22	Se continuó con el habilitado de acero	L22	Terminación de instalaciones hidro-sanitarias
L22	Inicio de instalaciones hidrosanitarias y gas	L22	Fumigación
L21	Se iniciaron instalaciones hidro-sanitarias	L22	Colocación de cimbra perimetral
L20	Se terminaron excavaciones de cimentación	L22	Colocación de acero en sitio
		L21	Terminación de instalaciones hidro-sanitarias
		L20	Inicio de instalaciones hidrosanitarias

PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS	ESTATUS	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
El retraso de los pagos de semanas anteriores afectó el ritmo del proyecto impactando en tiempo	Importante	--	Altozano
Revisar programa y reprogramación por desfase en pagos con cliente	Importante	--	Metta

CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	18.03%	15.70%	-2.34%	18.03% 15.70%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	13.61%	8.49%	-5.11%	13.61% 8.49%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	8.61%	6.11%	-2.50%	8.61% 6.11%
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	7.99%	4.44%	-3.55%	7.99% 4.44%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	0.66%	2.84%	2.18%	0.66% 2.84%
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	0.59%	0.38%	-0.20%	0.59% 0.38%


LÍNEA DEL TIEMPO GENERAL

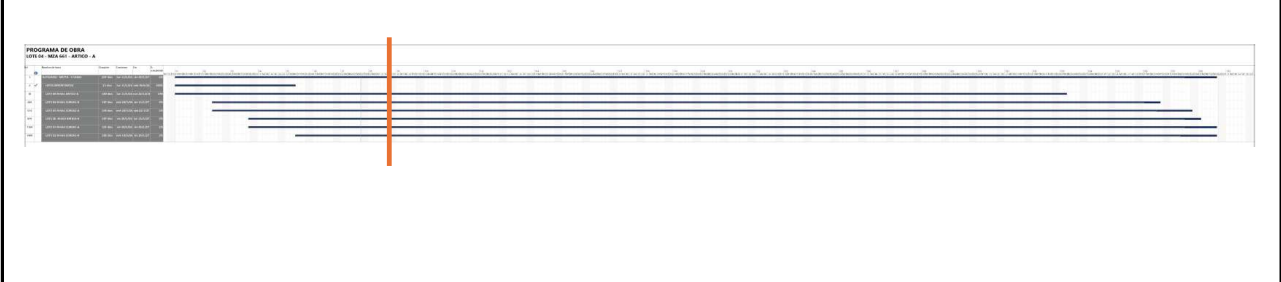

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

metta arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 08
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026	

PROGRAMA MAESTRO

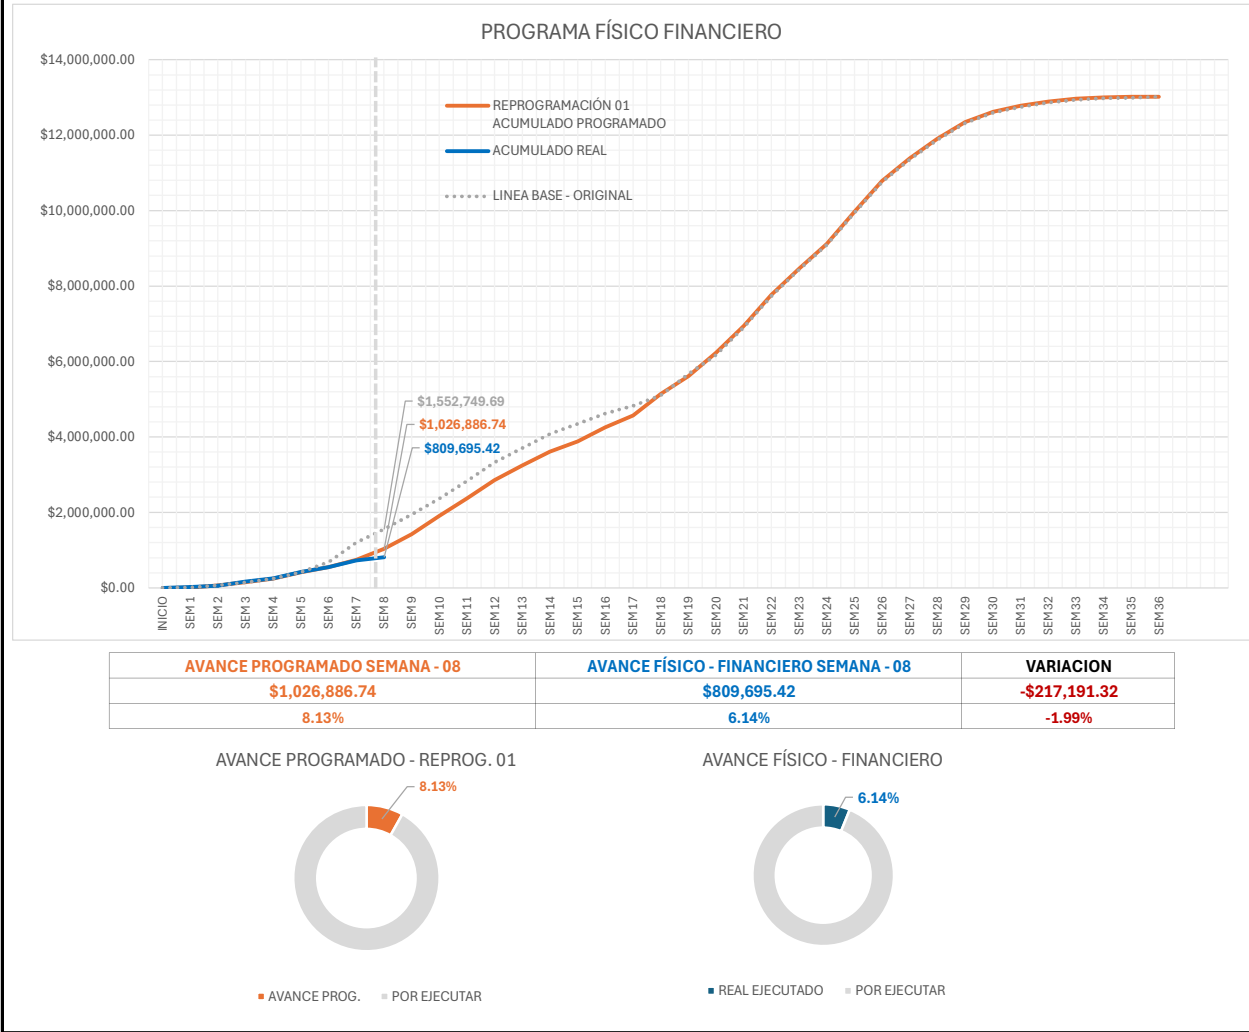

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 07			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Complemento de Ladrillo y Block para L02	29-jun	Suministrado	Alta
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21	27-jun	Suministrado	Media
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Acero para lote 21	7-jul	Solicitado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21	7-jul	Solicitado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 20	7-jul	Solicitado	Media
Viguetas para losa de entrepiso Lote 04	7-jul	En cotización	Media

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 08
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026	

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 04 - MZA 661






AVANCE PROGRAMADO:	18.03%	
AVANCE REAL:	15.70%	DIF: -2.34%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Pegado de muros de ladrillo y block en enrasas

Colado de castillos en enrasas

Colado de Columnas en cochera

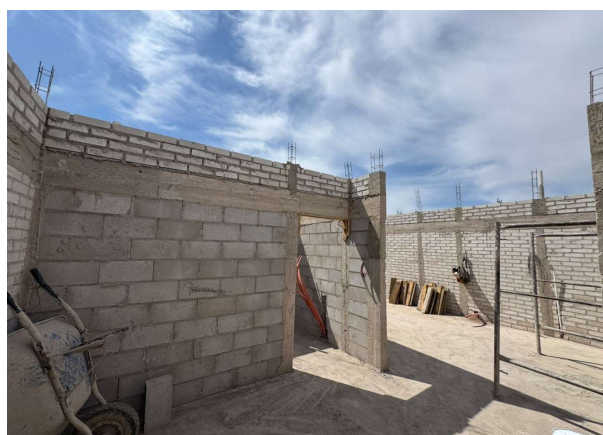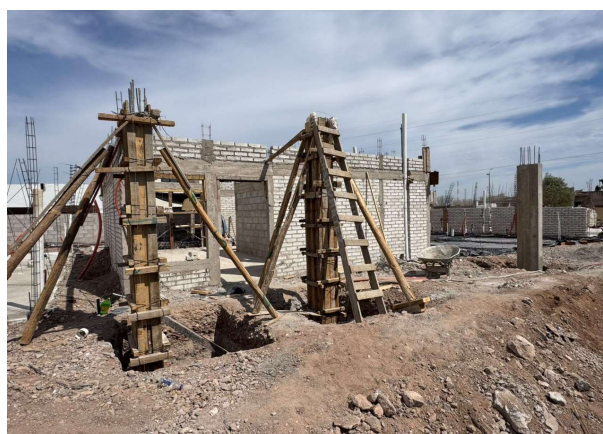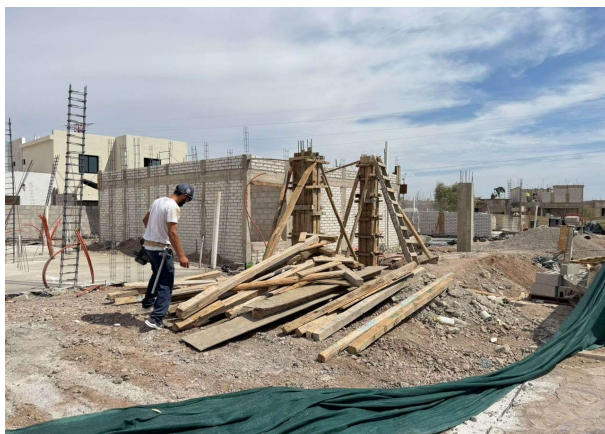

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026

SEMANA No.

08

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	13.61%	
AVANCE REAL:	8.49%	DIF: -5.11%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Inicio de pegado de muros de block
Inicio de colado de castillos
Suministro del resto de tabique térmico



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 08
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026	

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	8.61%	
AVANCE REAL:	6.11%	DIF: -2.50%

ACTIVIDADES RELEVANTES

fumigación y colocación de Hule Negro

Inicio de colocación de acero de cimentación en sitio



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026

SEMANA No.

08

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.59%	
AVANCE REAL:	0.38%	DIF: -0.20%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Terminación de excavaciones de cimentación
Inicio de excavaciones para instalaciones Hidro-sanitarias



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026

SEMANA No.

08

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 21 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.66%	
AVANCE REAL:	2.84%	DIF: 2.18%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Inicio de instalaciones Hidrosanitarias



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 29 JUN AL 04 JUL 2026

SEMANA No.

08

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	7.99%	
AVANCE REAL:	4.44%	DIF: -3.55%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Inicio de instalaciones de Gas

