

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL


	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 10
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026	

ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 10		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 11	
No. Lote	TAREA	No. Lote	TAREA
L02	Se continuó con muros de tabique y block hasta cerramientos	L02	Inicio de colados de cerramiento
L03	Se inició con los muros de tabique	L03	Continuación de pegado de muros de tabique y block
L04	Termino de aconodo de viguetas	L04	Instalaciones eléctricas en losa de entrepiso
L04	En espera de definiciones de armados de entrepiso	L04	Instalaciones Hidro-Sanitarias en losa de entrepiso
L22	Colocación de acero en sitio	L22	Inicio de muros de tabique
L22	Colado de Losa de cimentación	L21	Bajar acero en sitio
L21	Continuación en instalaciones Hidrosanitarais	L21	Colado de losa de cimentación
L20	Continuación en instalaciones Hidrosanitarais	L21	Colocación de cimbra perimetral
		L21	Colocación de acero en sitio
		L21	Colado de losa de cimentación
		L21	Terminación de instalaciones hidro-sanitarias
		L20	Terminación de instalaciones hidro-sanitarias

PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS	ESTATUS	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
El retraso de los pagos de semanas anteriores afectó el ritmo del proyecto impactando en tiempo	Importante	--	Altozano
Revisar programa y reprogramación por desfase en pagos con cliente	Importante	--	Metta / Altozano
Terminar de definir armados en entrepiso - Artico	Urgente		Altozano

CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	23.28%	19.58%	-3.71%	23.28% 19.58%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	18.46%	12.86%	-5.60%	18.46% 12.86%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	18.09%	11.03%	-7.06%	18.09% 11.03%
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	12.38%	8.84%	-3.54%	12.38% 8.84%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	3.46%	4.31%	0.85%	3.46% 4.31%
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	3.39%	0.89%	-2.50%	3.39% 0.89%

LÍNEA DEL TIEMPO GENERAL



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL




PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

10


PROGRAMA MAESTRO

PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO

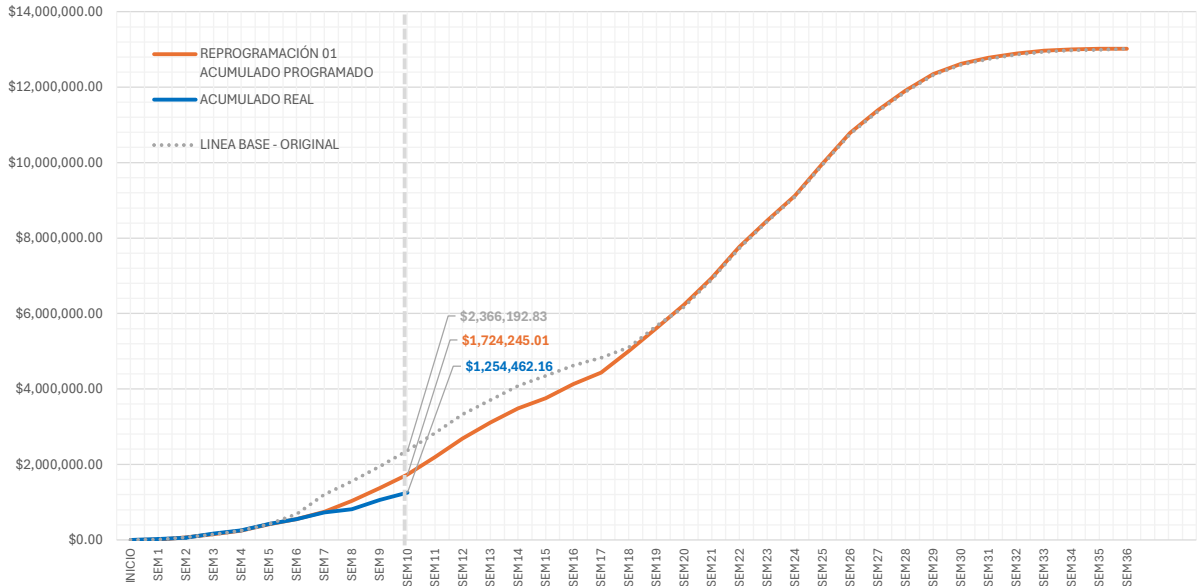


AVANCE PROGRAMADO SEMANA - 10	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO SEMANA - 10	VARIACION
\$1,724,245.01	\$1,254,462.16	-\$469,782.85
13.24%	9.51%	-3.73%

AVANCE PROGRAMADO - REPROG. 01



■ AVANCE PROG. ■ POR EJECUTAR

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO



■ REAL EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 10

CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Ladrillo Lote 03	14-jul	Suministrado	Media
Concreto Lote 22	14-jul	Suministrado	Media
Armex cerramientos Lote 02	14-jul	Suministrado	Media

PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS

CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Material para instalaciones eléctricas en losa de Lote 04	21-jul	Solicitado	Alta
Material para instalaciones Hidro-Sanitarias en losa de Lote 04	21-jul	Solicitado	Alta
Acero Lote 20	21-jul	Solicitado	Media
Concreto Lote 21	21-jul	Solicitado	Media

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 10
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026	

REPORTE FOTOGRÁFICO




LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO: 23.28%
AVANCE REAL: 19.58% **DIF:** -3.71%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Cimbra de trabes
 Habilitado de acero y cimbra de escalera
 urge definiciones de armados de trabes entrepiso

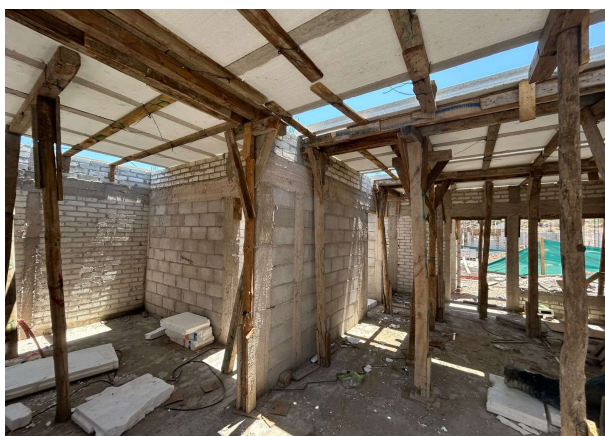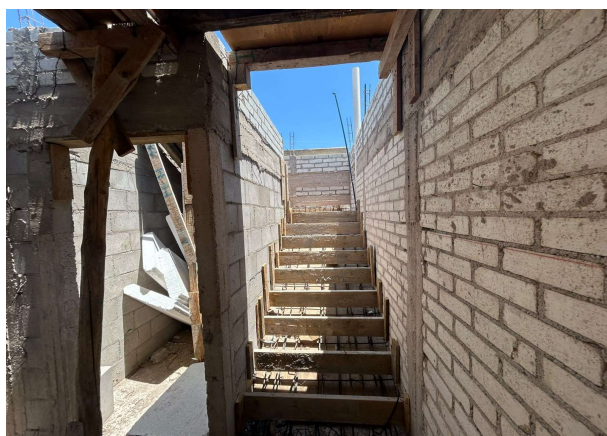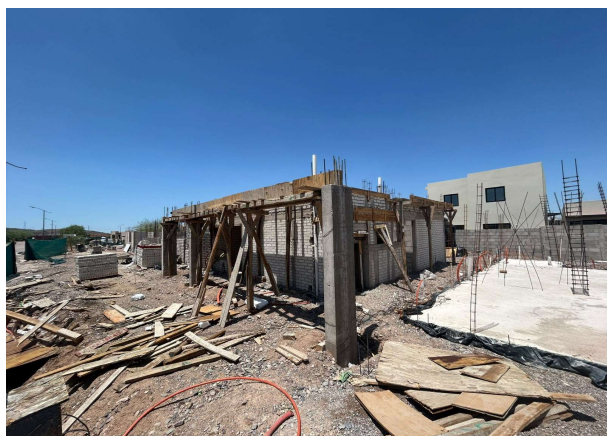

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

10

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOTE 02 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	18.46%	
AVANCE REAL:	12.86%	DIF: -5.60%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de pegado de ladrillo
Colado de castillos intermedios

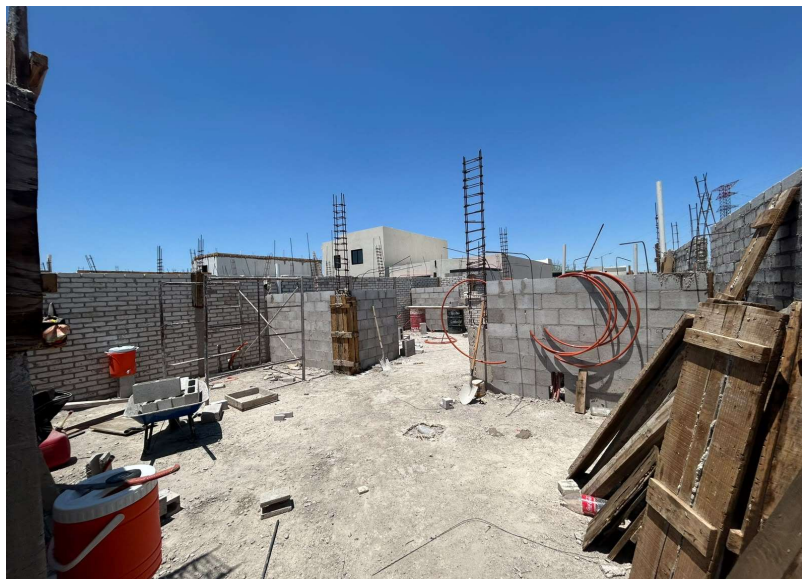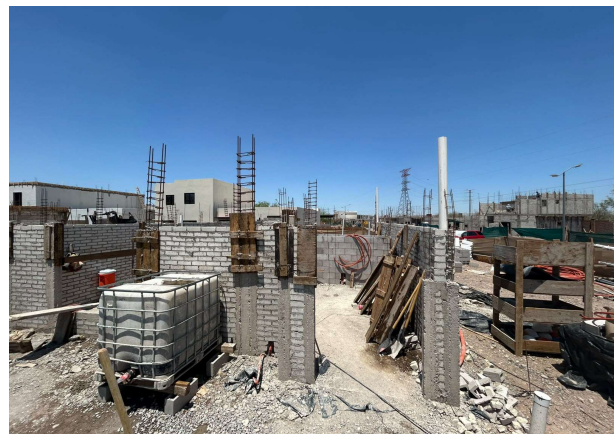

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

mettā arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 10
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026	

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	18.09%	
AVANCE REAL:	11.03%	DIF: -7.06%

ACTIVIDADES RELEVANTES
 Inicio de muros de tabique



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

10

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	3.39%	
AVANCE REAL:	0.89%	DIF: -2.50%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de instalaciones Hidro-Sanitarias



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

10

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 21 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.66%	
AVANCE REAL:	4.31%	DIF: 3.65%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de instalaciones Hidrosanitarias
Habilitado de acero de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 10 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

10

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	9.58%	
AVANCE REAL:	8.84%	DIF: -0.74%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Colado de losa de cimentación

