

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL




PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 11 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

11


PROGRAMA MAESTRO

PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO

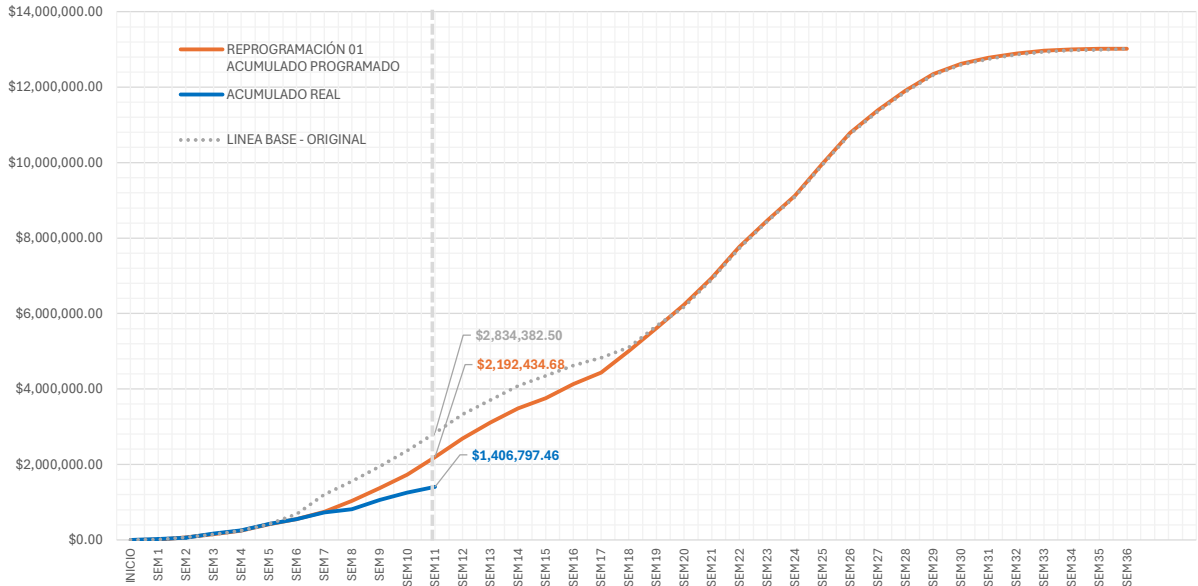


AVANCE PROGRAMADO SEMANA - 11	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO SEMANA - 11	VARIACION
\$2,192,434.68	\$1,406,797.46	-\$785,637.22
16.84%	10.67%	-6.17%

AVANCE PROGRAMADO - REPROG. 01



■ AVANCE PROG. ■ POR EJECUTAR

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO



■ REAL EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 10

CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Concreto Lote 21	22-jul	Pagado / se cuela lunes	Alta
Material para instalaciones eléctricas en losa de Lote 04	21-jul	Suministrado	Alta
Material para instalaciones Hidro-Sanitarias en losa de Lote 04	21-jul	Suministrado	Alta

PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS

CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Acero Lote 20	27-jul	Solicitado	Alta
Ladrillo Lote 22	27-jul	Solicitado	Alta
Armex Cerramientos Lote 02	27-jul	Solicitado	Media
Armex Cerramientos Lote 03	27-jul	Solicitado	Media
Concreto entrepiso Lote 044	--	Programar	Media

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 11
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 11 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026	

REPORTE FOTOGRÁFICO




LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	32.16%	
AVANCE REAL:	19.73%	DIF: -12.43%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Cimbra de trabes
Habilitado de acero y cimbra de escalera
urge definiciones de armados de trabes entrepiso

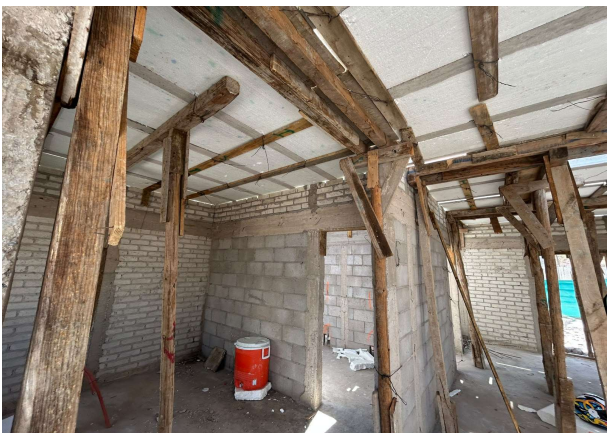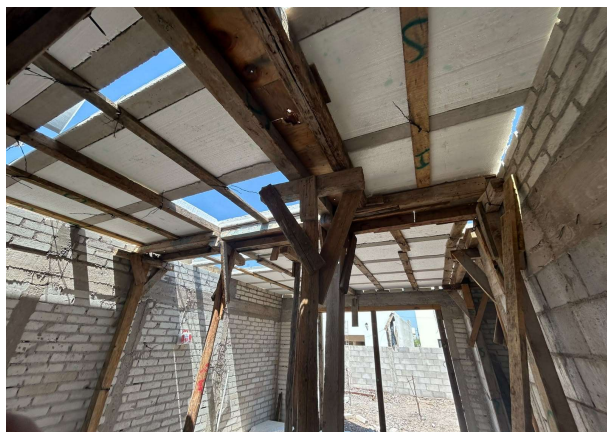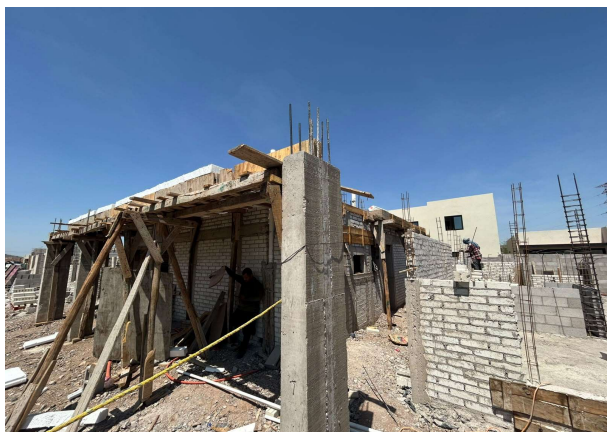

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 11 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

11

REPORTE FOTOGRÁFICO


LOTE 02 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	22.98%	
AVANCE REAL:	13.76%	DIF: -9.22%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de pegado de ladrillo
Colado de castillos intermedios

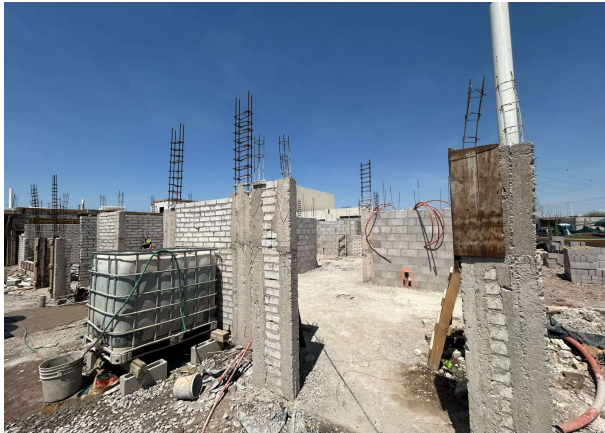

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 11 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

11




REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	21.25%	
AVANCE REAL:	13.82%	DIF: -7.43%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Inicio de muros de tabique

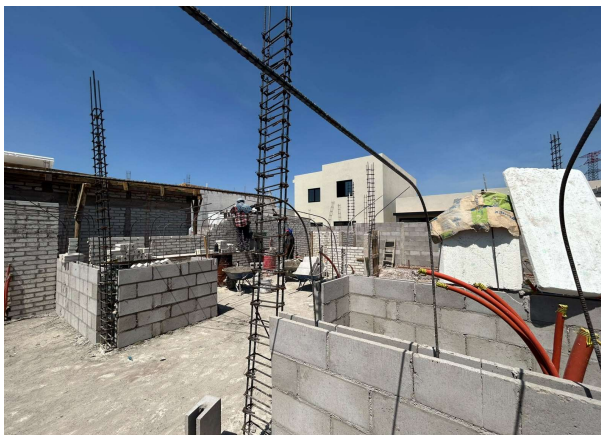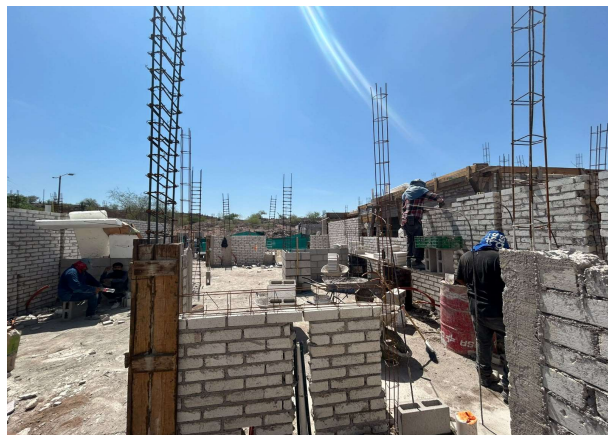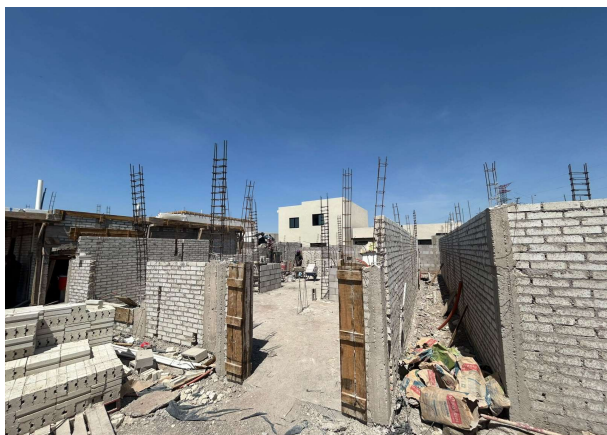

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 11 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

11

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	4.25%	
AVANCE REAL:	1.76%	DIF: -2.49%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de instalaciones Hidro-Sanitarias



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 11 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

11

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOTE 21 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	7.99%	
AVANCE REAL:	6.14%	DIF: -1.85%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de instalaciones Hidrosanitarias
Habilitado de acero de cimentación

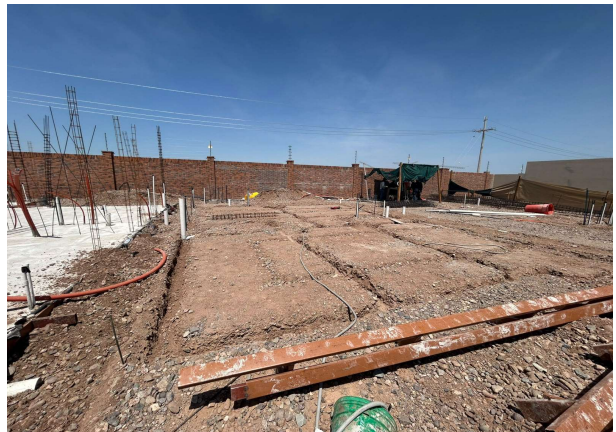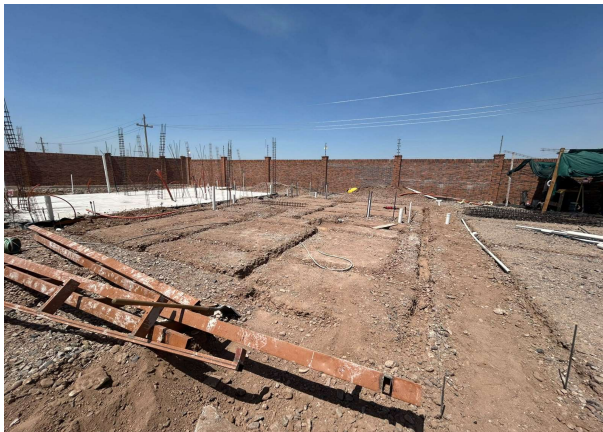

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 11 - DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

11

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	10.93%	
AVANCE REAL:	8.84%	DIF: -2.08%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Colado de losa de cimentación

