

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

metta arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 09
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026	

ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 09		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 10	
No. Lote	TAREA	No. Lote	TAREA
L02	Se continuó con muros de tabique y blok	L02	Llevar muros a altura de cerramiento
L02	Se inició con colado de castillos	L02	Inicio de colados de cerramiento
L03	Se coló la losa de cimentación	L03	Inicio de pegado de muros de tabique y block
L03	Se suministró tabique termico	L04	Instalaciones eléctricas en losa de entrepiso
L04	Se suministraron viguetas y bovedilla para losa de entrepiso	L04	Instalaciones Hidro-Sanitarias en losa de entrepiso
L04	Se inició con la cimbra para losa de entrepiso	L22	Fumigacion y hule negro
L22	Terminación de instalaciones Hidro-Sanitarias	L22	Bajar acero en sitio
L21	Se continuó con instalaciones Hidro-Sanitarias	L22	Colado de losa de cimentación
L20	Se iniciaron instalaciones Hidro-Sanitarias	L22	Colocación de cimbra perimetral
		L22	Colocación de acero en sitio
		L21	Terminación de instalaciones hidro-sanitarias
		L20	Inicio de instalaciones hidrosanitarias

PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS	ESTATUS	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
El retraso de los pagos de semanas anteriores afectó el ritmo del proyecto impactando en tiempo	Importante	--	Altozano
Revisar programa y reprogramación por desfase en pagos con cliente	Importante	--	Metta


CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	20.58%	18.64%	-1.95%	20.58% 18.64%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	15.76%	11.14%	-4.62%	15.76% 11.14%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	15.39%	10.03%	-5.36%	15.39% 10.03%
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	9.58%	4.93%	-4.66%	9.58% 4.93%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	0.66%	3.94%	3.28%	0.66% 3.94%
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	0.59%	0.54%	-0.04%	0.59% 0.54%

LÍNEA DEL TIEMPO GENERAL			
PROGRAMA DE OBRA 01/07/2026 - 01/07/2026			

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

metta arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 09
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026	

PROGRAMA MAESTRO

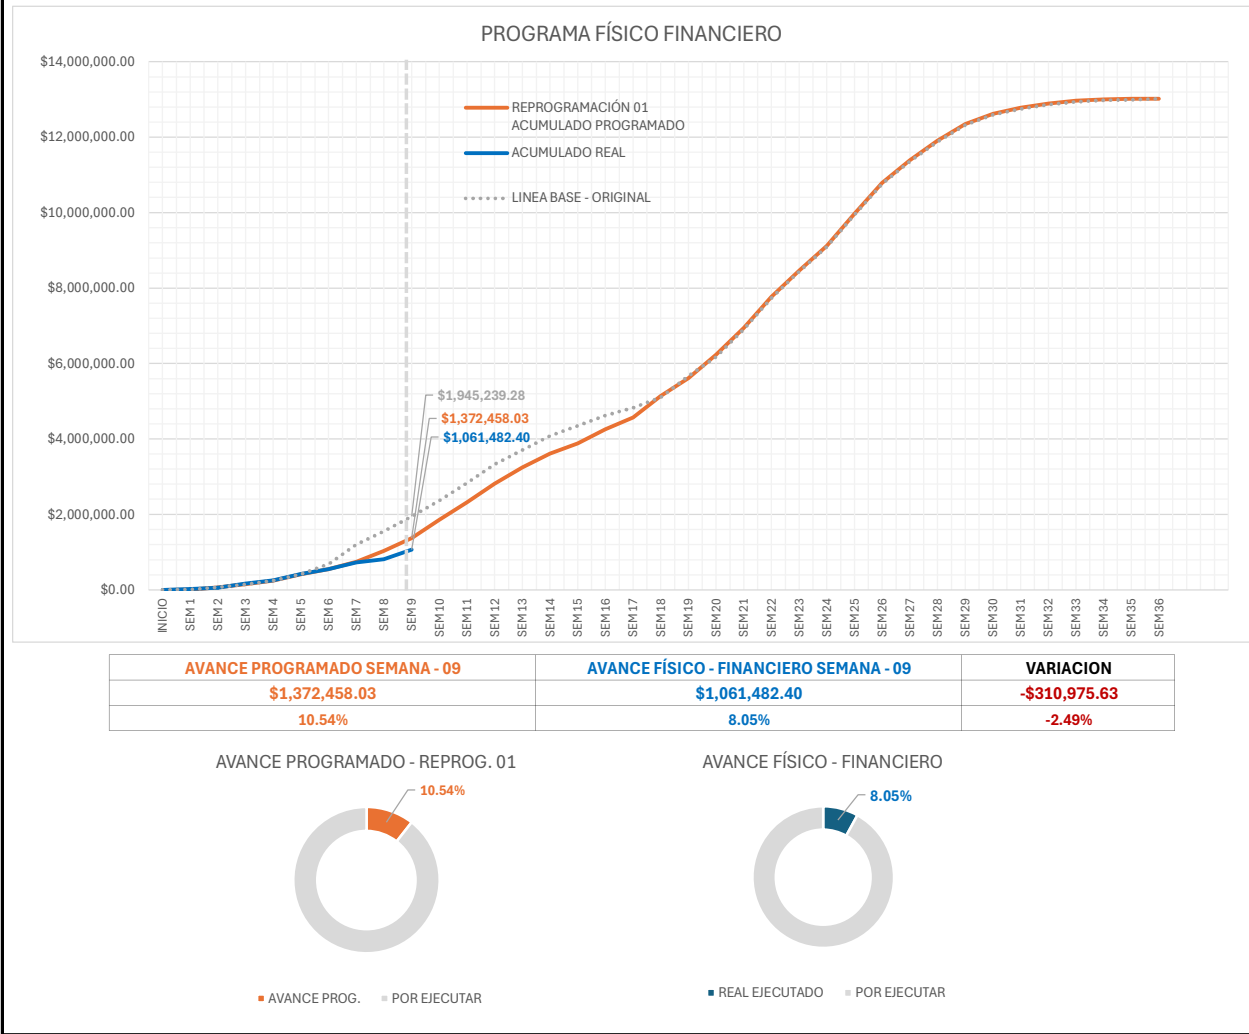

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 09			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Acero para lote 21	7-jul	Suministrado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21	7-jul	Suministrado	Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 20	7-jul	Suministrado	Media
Viguetas para losa de entrepiso Lote 04	7-jul	Suministrado	Media
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Ladrillo Lote 03	14-jul	Solicitado	Alta
Concreto Lote 22	14-jul	Solicitado	Alta
Armex cerramientos Lote 02	14-jul	Solicitado	Media
Material para instalaciones eléctricas en losa de Lote 04	14-jul	Solicitado	Media
Material para instalaciones Hidro-Sanitarias en losa de Lote 04	14-jul	Solicitado	Media
Acero Lote 20	14-jul	Solicitado	Baja

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

09

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 04 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	20.58%	
AVANCE REAL:	18.64%	DIF: -1.95%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Inicio de colocación de Viguetas y casetones
Cimbra para losa de entrepiso



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

09

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	15.76%	
AVANCE REAL:	11.14%	DIF: -4.62%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de pegado de ladrillo
Colado de castillos intermedios



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

09


REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 03 - MZA 661



AVANCE PROGRAMADO:	15.39%	
AVANCE REAL:	10.03%	DIF: -5.36%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Colado de Losa de Cimentación

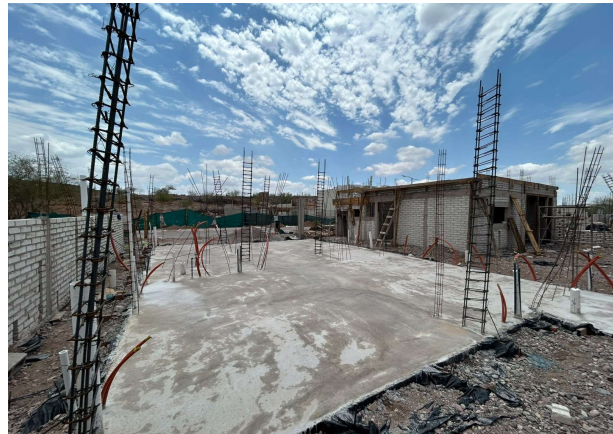

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

09

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 20, MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.59%	
AVANCE REAL:	0.54%	DIF: -0.04%

ACTIVIDADES RELEVANTES
Inicio de instalaciones Hidro-Sanitarias



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

09

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 21 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	0.66%	
AVANCE REAL:	3.94%	DIF: 3.28%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Continuación de instalaciones Hidrosanitarias
Habilitado de acero de cimentación



REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 09 - DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2026

SEMANA No.

09

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 22 MZA 663



AVANCE PROGRAMADO:	9.58%	
AVANCE REAL:	4.93%	DIF: -4.66%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Terminación de instalaciones hidráulicas

Terminación de habilitado de acero

