

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

 arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 01
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL	

[illegible][illegible]


CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL				
6 CASAS				
LOTE 20 M-663 ARTICO-A	0.48%	0.00%	-0.48%	0.48% 0.00%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LOTE 22 M-663 CORSAC-B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B	0.00%	0.37%	0.37%	0.00% 0.37%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LOTE 04 M-661 ARTICO-A	0.00%	0.55%	0.55%	0.00% 0.55%

[illegible]

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

metta arquitectura y construcción	PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS	SEMANA No. 01
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL	

PROGRAMA MAESTRO

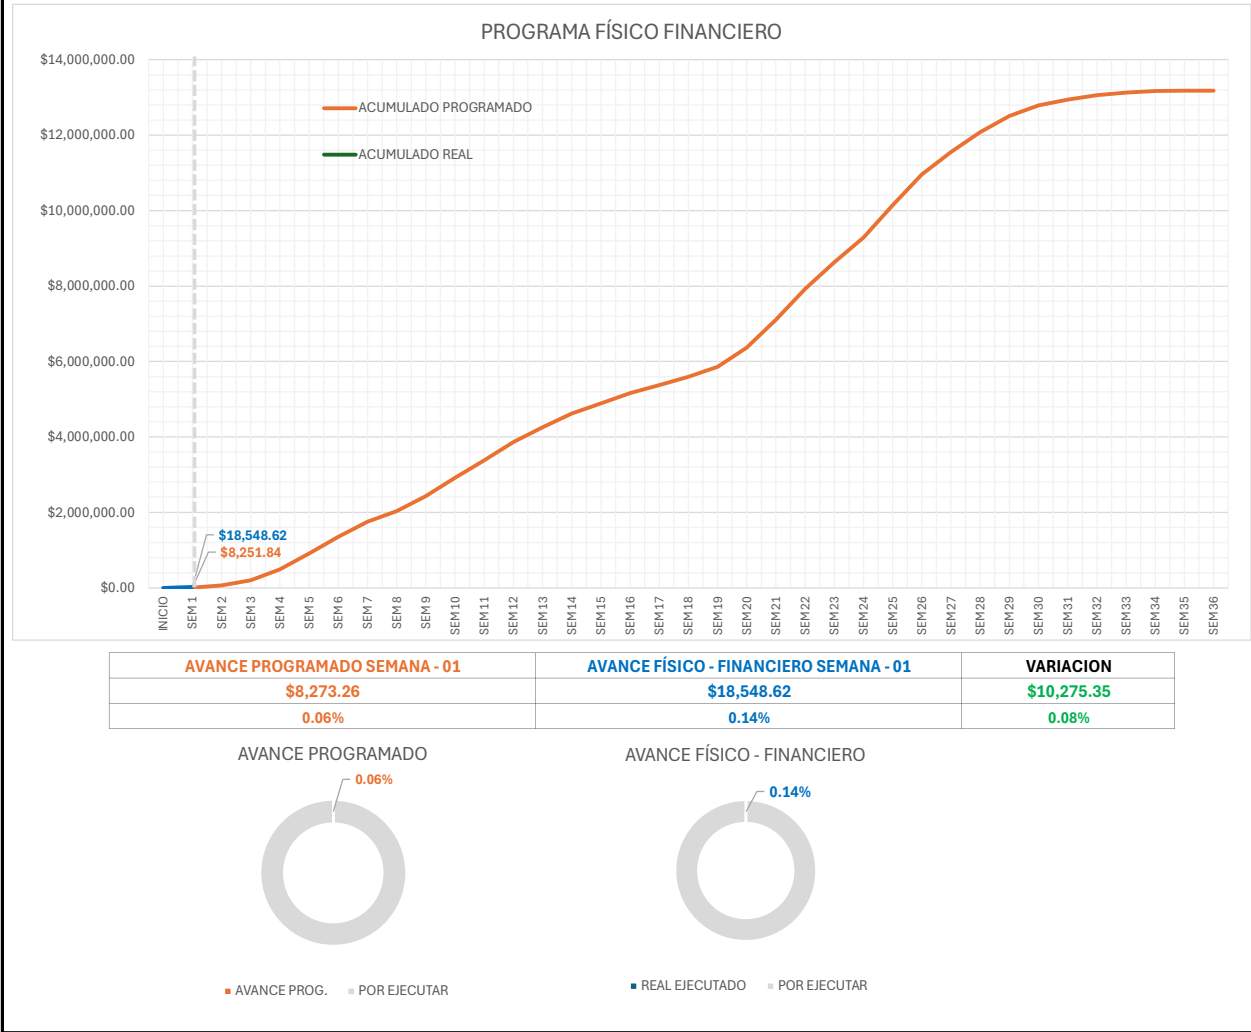

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 01			
CONCEPTO	FEHCA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FEHCA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Acero para cimentación Lote 04 Mza 661	19-may	Solicitado	Alta
Acero para cimentación Lote 20 Mza 663	19-may	Solicitado	Alta

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL

SEMANA No.

01

REPORTE FOTOGRÁFICO

LOTE 04 - MZA 663



Trazo, y excavaciones en cimentación

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



PROYECTO:	ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS
UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA
GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP
FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL

SEMANA No.

01

REPORTE FOTOGRÁFICO



LOTE 20 M663
Pendiente Plano para trazo



LOTE 21 M663
Pendiente Plano para trazo



LOTE 22 M663
Pendiente Plano para trazo



LOTE 02 M661
Trazo
