




REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

|                                                                      |                      |                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div> <div>metta</div> <div>arquitectura y construcción</div> </div> | PROYECTO:            | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS   | <div> <div>SEMANA No.</div> <div>02</div> </div> |
|                                                                      | UBICACIÓN:           | HERMOSILLO, SONORA               |                                                  |
|                                                                      | GERENCIA DE PROYECTO | METTA GROUP                      |                                                  |
|                                                                      | FECHA DEL PERIODO:   | SEMANA 02 - DEL 18 AL 23 DE MAYO |                                                  |

PROGRAMA MAESTRO

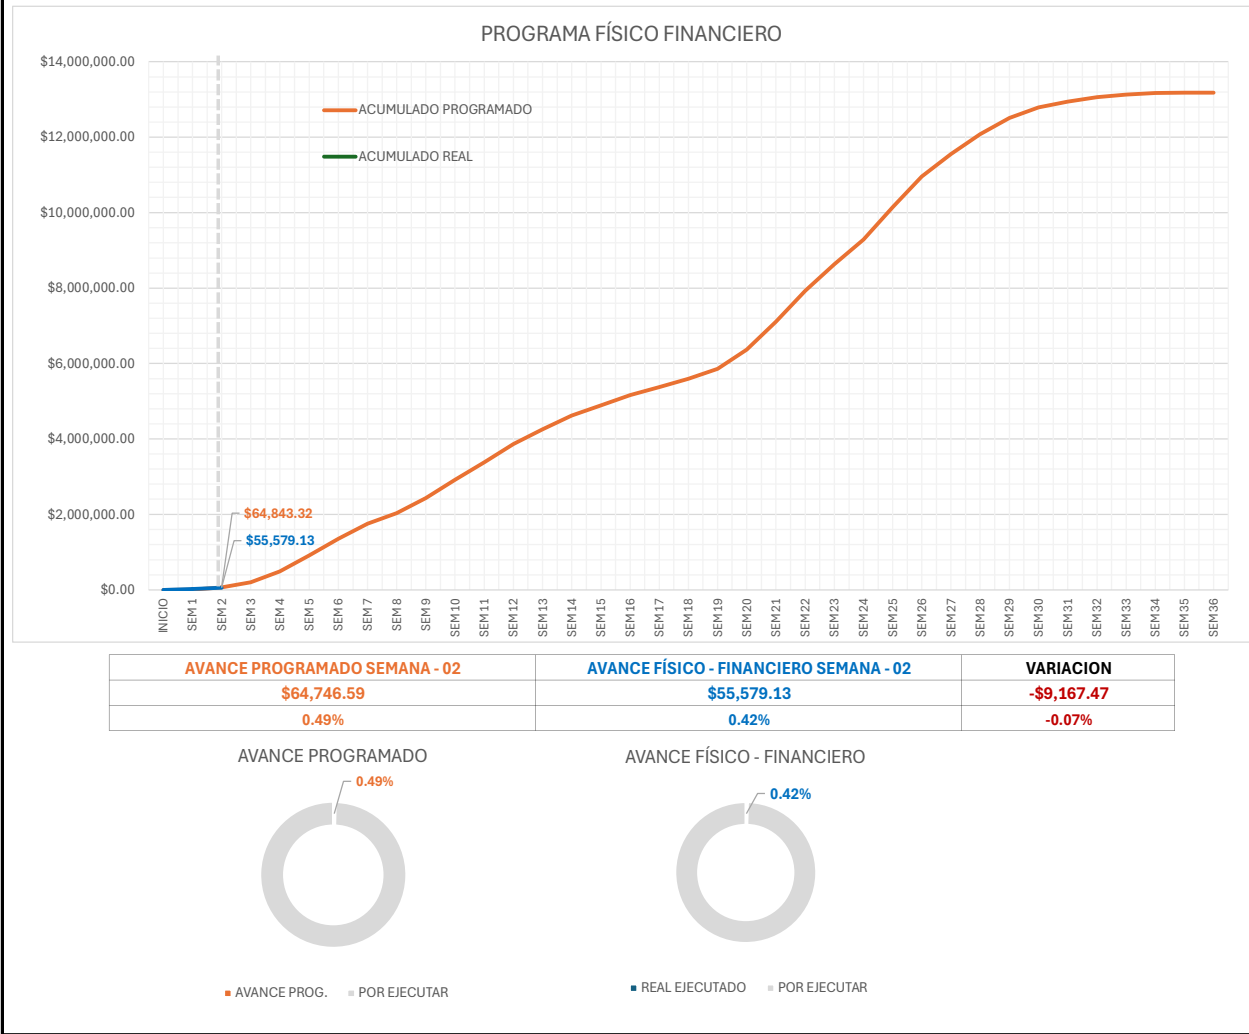

ABASTECIMIENTOS

| SEMANA 02                                   |                 |              |             |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| CONCEPTO                                    | FECHA REQUERIDA | ESTATUS      | IMPORTANCIA |
| Acero para cimentación Lote 04 Mza 661      | 19-may          | Suministrado | Alta        |
| Material Hidrosanitario Lote 04 Mza 661     | 20-may          | Suministrado | Medio       |
| Material de Gas Lote 04 Mza 661             | 20-may          | Suministrado | Medio       |
|                                             |                 |              |             |
|                                             |                 |              |             |
| PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS         |                 |              |             |
| CONCEPTO                                    | FECHA REQUERIDA | ESTATUS      | IMPORTANCIA |
| Acero para cimentación Lote 02 Mza 661      | 26-may          | Solicitado   | Alta        |
| Hule Negro para cimentación Lote 04 Mza 661 | 26-may          | Solicitado   | Alta        |
|                                             |                 |              |             |
|                                             |                 |              |             |
|                                             |                 |              |             |

## REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| PROYECTO:             | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS   |
| UBICACIÓN:            | HERMOSILLO, SONORA               |
| GERENCIA DE PROYECTO: | METTA GROUP                      |
| FECHA DEL PERIODO:    | SEMANA 02 - DEL 18 AL 23 DE MAYO |

SEMANA No.

02

### REPORTE FOTOGRÁFICO


#### LOTE 04 - MZA 661



|                    |       |
|--------------------|-------|
| AVANCE PROGRAMADO: | 2.65% |
| AVANCE REAL:       | 1.90% |

#### ACTIVIDADES RELEVANTES

Cimbra perimetral  
Excavaciones para acero e instalaciones  
Habilitado de acero de trabes de cimentación

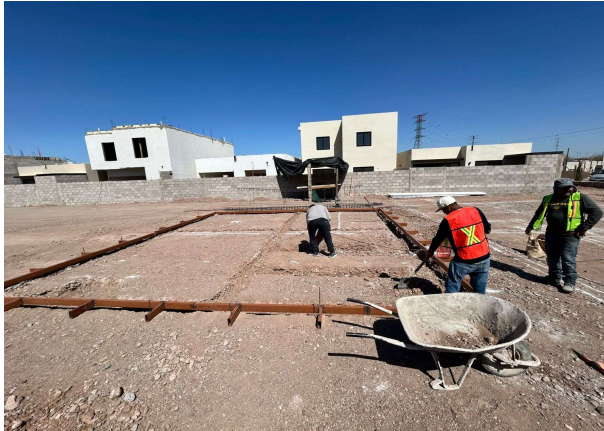

## REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| PROYECTO:            | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS   |
| UBICACIÓN:           | HERMOSILLO, SONORA               |
| GERENCIA DE PROYECTO | METTA GROUP                      |
| FECHA DEL PERIODO:   | SEMANA 02 - DEL 18 AL 23 DE MAYO |

SEMANA No.

**02**

### REPORTE FOTOGRÁFICO

#### LOTE 02 - MZA 661



|                    |       |
|--------------------|-------|
| AVANCE PROGRAMADO: | 0.39% |
| AVANCE REAL:       | 0.51% |

#### ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

Excavaciones de cimentación



## REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| PROYECTO:            | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS   |
| UBICACIÓN:           | HERMOSILLO, SONORA               |
| GERENCIA DE PROYECTO | METTA GROUP                      |
| FECHA DEL PERIODO:   | SEMANA 02 - DEL 18 AL 23 DE MAYO |

SEMANA No.

02

### REPORTE FOTOGRÁFICO

#### LOTE 03 - MZA 661



|                    |       |
|--------------------|-------|
| AVANCE PROGRAMADO: | 0.40% |
| AVANCE REAL:       | 0.43% |

#### ACTIVIDADES RELEVANTES

Trazo

Excavaciones de cimentación



## REPORTE DE ESTATUS SEMANAL



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| PROYECTO:            | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS   |
| UBICACIÓN:           | HERMOSILLO, SONORA               |
| GERENCIA DE PROYECTO | METTA GROUP                      |
| FECHA DEL PERIODO:   | SEMANA 02 - DEL 18 AL 23 DE MAYO |

SEMANA No.

**02**

### REPORTE FOTOGRÁFICO

#### LOTES 20, 21 Y 22 - MZA 663



LOTE 20 MZA 663



LOTE 21 MZA 663



LOTE 22 MZA 663
